


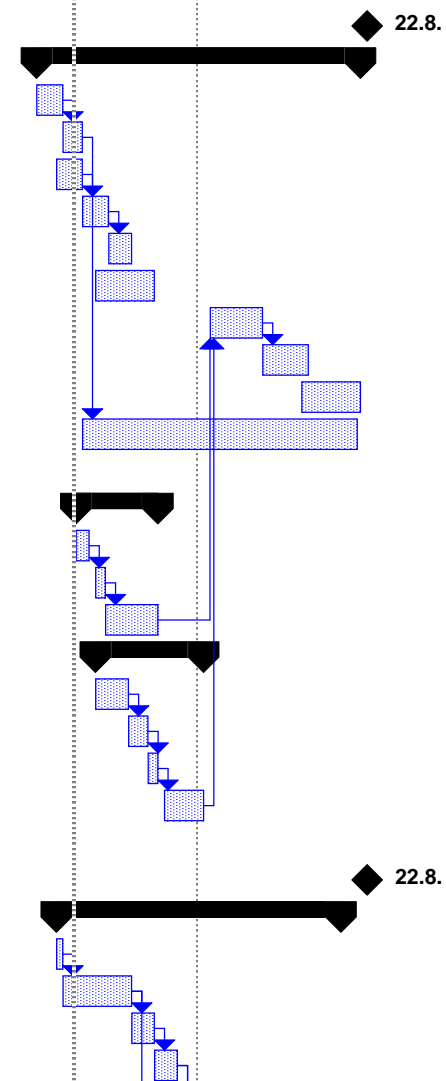


ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvr. 2, 2010			Čtvr. 3, 2010			Čtvr. 4, 2010		
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
1														
2		Náměstí dle SoD	0 dny	22.8. 10	22.8. 10									
3		Náměstí	71 dny	13.5. 10	19.8. 10									
4		aktivní zóna - spodní 1/2	6 dny	13.5. 10	20.5. 10									
5		ŠD - spodní 1/2	4 dny	21.5. 10	26.5. 10									
6		dokončení sítí - horní 1/2 náměstí	6 dny	19.5. 10	26.5. 10									
7		aktivní zóna - horní 1/2 náměstí	6 dny	27.5. 10	3.6. 10									
8		ŠD - horní 1/2	5 dny	4.6. 10	10.6. 10									
9		Fontána	14 dny	31.5. 10	17.6. 10									
10		Předsazené schody	12 dny	5.7. 10	20.7. 10									
11		Obklad předsazených schodů	10 dny	21.7. 10	3.8. 10									
12		Dokončování náměstí - lavičky, stromy atp	14 dny	2.8. 10	19.8. 10									
13		Dláždění	60 dny	27.5. 10	18.8. 10									
14														
15		Bartolomějská	19 dny	25.5. 10	18.6. 10									
16		aktivní zóna Bartolomějská	4 dny	25.5. 10	28.5. 10									
17		ŠD Bartolomějská	3 dny	31.5. 10	2.6. 10									
18		dláždění Bartolomějské	12 dny	3.6. 10	18.6. 10									
19		u septiku MěÚ	25 dny	31.5. 10	2.7. 10									
20		zrušení septiku MěÚ a propojení do řadu Kostelní	8 dny	31.5. 10	9.6. 10									
21		aktivní zóna u septiku MěÚ	4 dny	10.6. 10	15.6. 10									
22		ŠD u septiku MěÚ	3 dny	16.6. 10	18.6. 10									
23		dláždění u septiku MěÚ	10 dny	21.6. 10	2.7. 10									
24														
25		Kostelní dle dod.č.2	0 dny	22.8. 10	22.8. 10									
26		Kostelní ulice	63 dny	19.5. 10	13.8. 10									
27		pokládka panelů	2 dny	19.5. 10	20.5. 10									
28	132m	hlavní řad kanalizace	15 dny	21.5. 10	10.6. 10									
29	110m	hlavní řad vody	5 dny	11.6. 10	17.6. 10									
30	10ks	přípojky vody a kanalizace	5 dny	18.6. 10	24.6. 10									







Projekt: HMG - krizovy
Datum: 24.5. 10





ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvr. 2, 2010			Čtvr. 3, 2010			Čtvr. 4, 2010			
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		
31		VO	4 dny	25.6. 10	30.6. 10										
32		úprava ČEZ	4 dny	25.6. 10	30.6. 10										
33		aktivní zóna	7 dny	1.7. 10	9.7. 10										
34		ŠD	5 dny	12.7. 10	16.7. 10										
35		povrchy	20 dny	19.7. 10	13.8. 10										
36		oprava kostelní zídky	7 dny	12.7. 10	20.7. 10										
37															
38		Husova dle dod.č.2	0 dny	30.10. 10	30.10. 10										
39		Husova	103 dny	25.5. 10	14.10. 10										
40	130m	hlavní řad kanalizace	27 dny	25.5. 10	30.6. 10										
41	i - Integra	S7-S8	2 dny	25.5. 10	26.5. 10										
42		S8-S9	7 dny	27.5. 10	4.6. 10										
43		S9-S10	4 dny	7.6. 10	10.6. 10										
44		S10-S11	4 dny	11.6. 10	16.6. 10										
45		S11-S12	5 dny	17.6. 10	23.6. 10										
46		S12-KS	5 dny	24.6. 10	30.6. 10										
47	111m	hlavní řad vody	7 dny	1.7. 10	9.7. 10										
48	20ks	přípojky vody a kanalizace	10 dny	12.7. 10	23.7. 10										
49	7ks	anglické dvorky	10 dny	1.6. 10	14.6. 10										
50		VO	6 dny	26.7. 10	2.8. 10										
51		úprava ČEZ	4 dny	26.7. 10	29.7. 10										
52		aktivní zóna	13 dny	3.8. 10	19.8. 10										
53		ŠD	10 dny	20.8. 10	2.9. 10										
54		povrchy	30 dny	3.9. 10	14.10. 10										
55															
56		Lutherova dle dod.č.2	0 dny	30.10. 10	30.10. 10										
57		Lutherova	89 dny	11.6. 10	13.10. 10										
58	72m	hlavní řad kanalizace	15 dny	11.6. 10	1.7. 10										
59	120m	hlavní řad vody	7 dny	2.7. 10	12.7. 10										
60	6ks	přípojky vody a kanalizace	7 dny	13.7. 10	21.7. 10										


Projekt: HMG - krizovy
Datum: 24.5. 10

Úkol 
Rozdělení 
Průběh 




Milník 
Souhrnný 
Souhrn projektu 

Vnější úkoly 
Vnější milník 
Konečný termín 


ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvr. 2, 2010			Čtvr. 3, 2010			Čtvr. 4, 2010		
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
61		VO	8 dny	22.7. 10	2.8. 10									
62	přeložka	úprava ČEZ	10 dny	22.7. 10	4.8. 10									
63		aktivní zóna	10 dny	5.8. 10	18.8. 10									
64		ŠD	10 dny	19.8. 10	1.9. 10									
65		povrchy	30 dny	2.9. 10	13.10. 10									
66														
67		Lékárnická dle dod.č.2	0 dny	22.8. 10	22.8. 10									
68		Lékárnická	61 dny	17.5. 10	9.8. 10									
69		hlavní řad vody	5 dny	17.5. 10	21.5. 10									
70		přípojky vody a kanalizace	10 dny	24.5. 10	4.6. 10									
71		VO	4 dny	7.6. 10	10.6. 10									
72		O2	4 dny	7.6. 10	10.6. 10									
73		CEZ	4 dny	7.6. 10	10.6. 10									
74		akt.zóna	12 dny	11.6. 10	28.6. 10									
75		ŠD	10 dny	29.6. 10	12.7. 10									
76		povrchy	20 dny	13.7. 10	9.8. 10									
77														
78		Liberecká dle dod.č.2	0 dny	22.8. 10	22.8. 10									
79		Liberecká	67 dny	20.5. 10	20.8. 10									
80	10	kanalizační přípojky k náměstí	6 dny	20.5. 10	27.5. 10									
81	4	kanalizační přípojky k parkovišti	3 dny	28.5. 10	1.6. 10									
82	122	hlavní řad vody	10 dny	2.6. 10	15.6. 10									
83	9ks	přípojky vody	5 dny	16.6. 10	22.6. 10									
84		VO	7 dny	16.6. 10	24.6. 10									
85		ČEZ	10 dny	16.6. 10	29.6. 10									
86		ochrana O2	7 dny	16.6. 10	24.6. 10									
87		akt.zóna	14 dny	25.6. 10	14.7. 10									
88		ŠD	7 dny	15.7. 10	23.7. 10									
89		povrchy	20 dny	26.7. 10	20.8. 10									
90														

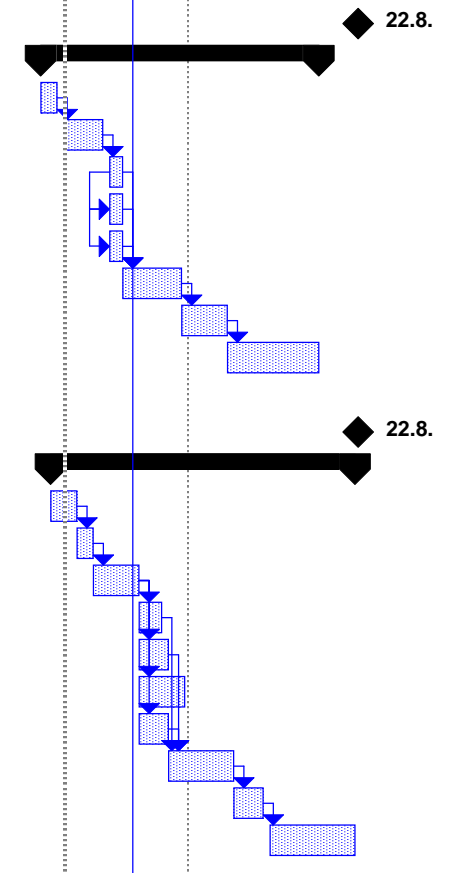




Projekt: HMG - krizovy
Datum: 24.5. 10




ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrť. 2, 2010			Čtvrť. 3, 2010			Čtvrť. 4, 2010		
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
91		Anglická dle dod.č.2	0 dny	22.8. 10	22.8. 10									
92		Anglická	67 dny	20.5. 10	20.8. 10									
93	11ks	kanalizační přípojky	15 dny	20.5. 10	9.6. 10									
94	78m	hlavní řad vody	7 dny	10.6. 10	18.6. 10									
95	7ks	přípojky vody	7 dny	21.6. 10	29.6. 10									
96		VO	7 dny	21.6. 10	29.6. 10									
97		ochrana O2	7 dny	21.6. 10	29.6. 10									
98		ČEZ	10 dny	21.6. 10	2.7. 10									
99		akt.zóna	8 dny	5.7. 10	14.7. 10									
100		ŠD	7 dny	15.7. 10	23.7. 10									
101		povrchy	20 dny	26.7. 10	20.8. 10									
102														
103		Školní dle dod.č.2	0 dny	29.8. 10	29.8. 10									
104		Školní	74 dny	19.5. 10	30.8. 10									
105	70m	hlavní řad kanalizace - první část	15 dny	19.5. 10	8.6. 10									
106	90m	hlavní řad kanalizace - druhá část	12 dny	11.6. 10	28.6. 10									
107	160m	hlavní řad vody	7 dny	22.6. 10	30.6. 10									
108	17ks	kanalizační přípojky	15 dny	11.6. 10	1.7. 10									
109	2ks	přípojky vody	2 dny	1.7. 10	2.7. 10									
110		VO	7 dny	2.7. 10	12.7. 10									
111		ochrana O2	7 dny	2.7. 10	12.7. 10									
112		ČEZ	7 dny	2.7. 10	12.7. 10									
113		akt.zóna	8 dny	13.7. 10	22.7. 10									
114		ŠD	7 dny	23.7. 10	2.8. 10									
115		povrchy	20 dny	3.8. 10	30.8. 10									
116														
117		Tichá dle dod.č.2	0 dny	30.10. 10	30.10. 10									
118		Tichá	87 dny	30.6. 10	28.10. 10									
119	145m	hlavní řad kanalizace	30 dny	30.6. 10	10.8. 10									
120	145m	hlavní řad vody	15 dny	26.7. 10	13.8. 10									

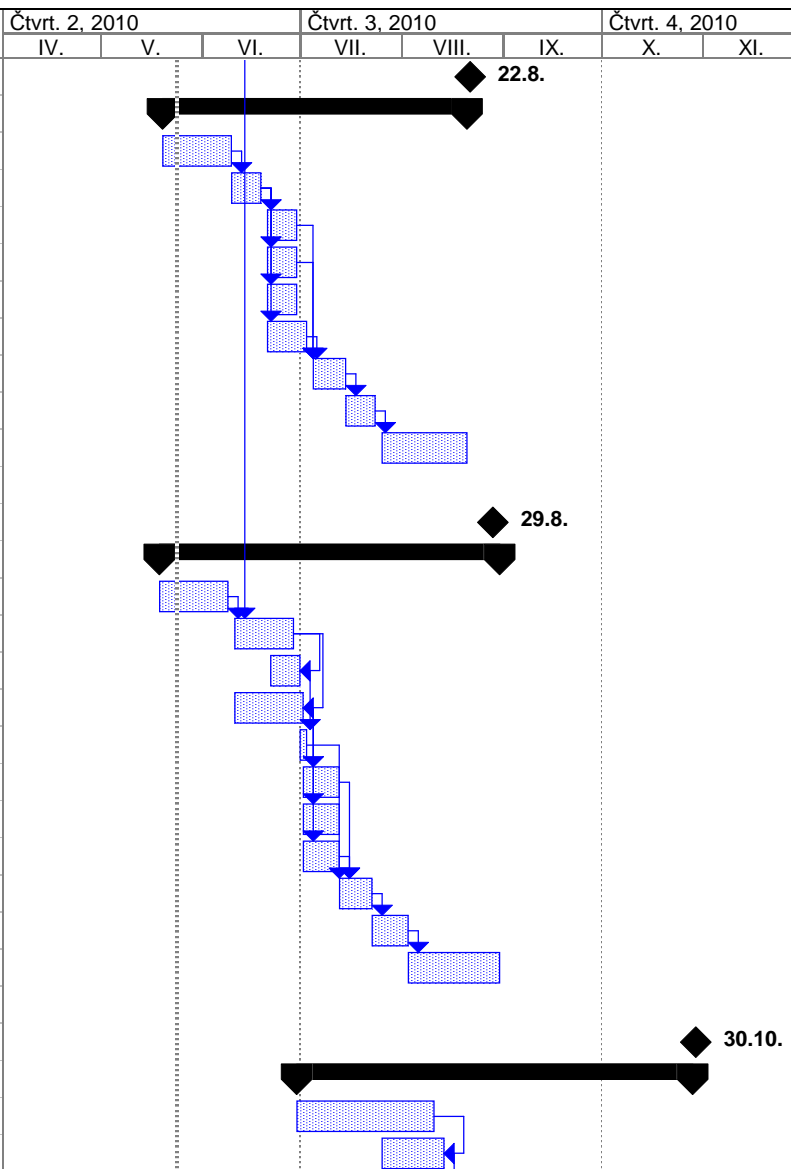

Projekt: HMG - krizovy
Datum: 24.5. 10



ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvr. 2, 2010			Čtvr. 3, 2010			Čtvr. 4, 2010	
						IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.
121	11ks	přípojky kanalizace a vody	7 dny	16.8. 10	24.8. 10								
122		VO	5 dny	25.8. 10	31.8. 10								
123		ochrana O2	2 dny	25.8. 10	26.8. 10								
124		ČEZ	10 dny	25.8. 10	7.9. 10								
125		akt.zóna	10 dny	8.9. 10	21.9. 10								
126		ŠD	7 dny	22.9. 10	30.9. 10								
127		povrchy	20 dny	1.10. 10	28.10. 10								

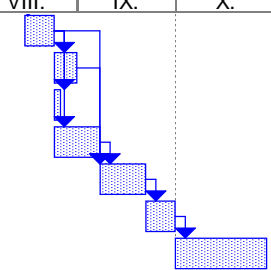

Projekt: HMG - krizovy
Datum: 24.5. 10

